Agent Workflow

설계 의도를 실행과 검증으로 잇는 게임 제작 공정

Creator 중심 설계 · AI Agent 구현 · Programmer 품질 개선



NeoSeoul 프로토타입 / 2026-10-07 저장 상태 캡처
기존 제작 사례이며 신규 월드의 완성 화면과 구분한다.

Unreal Engine · Production Engineering · SF Team Hub

2026.10.26 / 최신 근거 + SF Team Hub 공정 화면

01 / PRODUCTION MODEL

게임 제작을 검증 가능한 계약으로

목표와 품질 판단은 사람이 소유하고, 승인된 범위의 구현·검증은 Agent가 이어간다.

설계한 제작 방식

게임 규칙·상태·입출력·실패 조건·보존 범위·완료 기준을 명시한다. 코드를 요청하는 수준에서 나아가, 결과를 확인하고 다음 작업으로 이어갈 수 있는 제작 계약을 만든다.

서로 다른 품질 책임

구분	설계 및 확인한 결과
Creator	경험과 시스템 설계, 범위·완료 기준, 사람 편집과 플레이 검수. 실제 결과가 제작 의도를 충족하는지 판단한다.
AI Agent	최신 요구·코드·결정·Evidence 조사, 구현과 도구 실행, 영향 범위 회귀검증, 실패 복구와 결과 기록.
Programmer	여러 완료 작업의 구조·수명주기·기능 품질을 종합 검토하고, 리팩터링과 Workflow·Skill·Tool·Test 개선에 환원한다.

완료 이후의 개선도 공정에 포함

설계
Goal / Acceptance

→

구현·검증
변경 / Evidence

→

사람 수용
경험 / 품질

→

공정 개선
Review / Reuse

같은 목표에서 발견한 도구 부족은 필요한 범위의 기반 개선으로 해결하고 원래 제작으로 복귀한다. 독립적인 완료 기준을 가진 변경은 별도 작업으로 분리한다.

장기 목표와 현재 성과

소규모 팀이 적은 판단·검수 시간으로 제작을 이어가는 운영을 지향한다. 시간·인력·토큰 절감률은 아직 동일 조건으로 측정하지 않았으며, 완전 무인 게임 제작을 달성했다고 주장하지 않는다.

근거 [S1][S2] / 역할·공정 설계 및 실제 제작 사례를 대조.

02 / ARCHITECTURE

작업의 크기에 맞는 세 가지 진입

영속 상태와 실행 지침의 책임을 나눠 세션이 바뀌어도 현재 기준을 복원한다.

구분	설계 및 확인한 결과
GitHub Issue	작은 기능·버그·기반 정비. Goal·Scope·Acceptance·결정·검증·다음 행동을 GitHub에 남긴다.
Team Hub Spec	플랜·기술 논점·설계 합의·구현 목록·AI/사람 검증·발행이 필요한 작업. Revision·Stage·Gate는 Hub가 소유한다.
직접 요청	영속 일감이 필요 없는 조회·작은 수정. 현재 요청의 승인 범위와 실제 대상을 기준으로 처리한다.

실행과 지식의 책임 경계

AGENTS / Rules
권한·보존·품질

→

Workflow / Skill
작업 판단·전문 절차

→

Runtime / Tools
계약 검사·실행

구분	설계 및 확인한 결과
프로젝트 Docs	사람이 읽는 제품·기술·운영 설명. 실행 계약·코드와 대조해 갱신한다.
AI / .agents	공통 행동·전문 절차. Codex 발견용 진입점과 실제 Skill 원문을 연결하고 중복을 줄인다.
Evidence / Store	실행 결과·버전·작성자·검증·결정 이력. 한 시스템의 상태를 별도 문서 상태 머신으로 복제하지 않는다.

Agent가 의미와 다음 행동을 판단하고 Runtime은 구조·계약을 검사한다. 고정 키워드 분류나 직군별 단계 수를 늘려 실행 능력을 대신하지 않는다.

근거 [S1][S2] / 최신 ProjectSF AGENTS 및 실행 아키텍처.

03 / SF TEAM HUB

합의한 버전으로 구현하고 발행한다

Issue 기반 제작을 유지하면서 복합 작업의 기획·설계·수용 이력을 구조화했다.



실제 적용: SPEC-74 Revision 3

구분	설계 및 확인한 결과
20개 구현 완료	v133 당시 구현 목록과 제작자 수락을 기록했다.
18개 기술 PASS	각 항목의 검증 근거와 사람 판정을 구분했다.
CURRENT 발행	가이드·원격 main 확인을 거쳐 발행하고 연결 Issue #74 CLOSED를 재조회했다.

실패와 재개의 설계

저장은 현재 Store·문서·설계 버전으로 요청하고 receipt와 readback을 확인한다. 충돌은 오래된 쓰기를 거부하며, 중단 후에는 Spec ID로 현재 버전·승인·미완료 항목을 다시 찾는다.

판정은 각 단계의 근거를 따른다


도구 응답 성공, 실제 저장, 구현 완료, AI 판정, 사람 판정, VERIFY, 원격 main 포함, CURRENT 발행을 별도로 기록한다. 새 Revision에서도 기존 결정과 발행본을 보존한다.

근거 [S3] / 20·18은 SPEC-74의 당시 기록이며 다른 Spec과 합산하지 않음.

SITE WALKTHROUGH 01 / PLAN

요청을 플랜으로 저장하고 확정한다

진입: Recipe 또는 기존 Issue 연결 → 플랜 작성·보완 → 저장 → 제작자 확정.

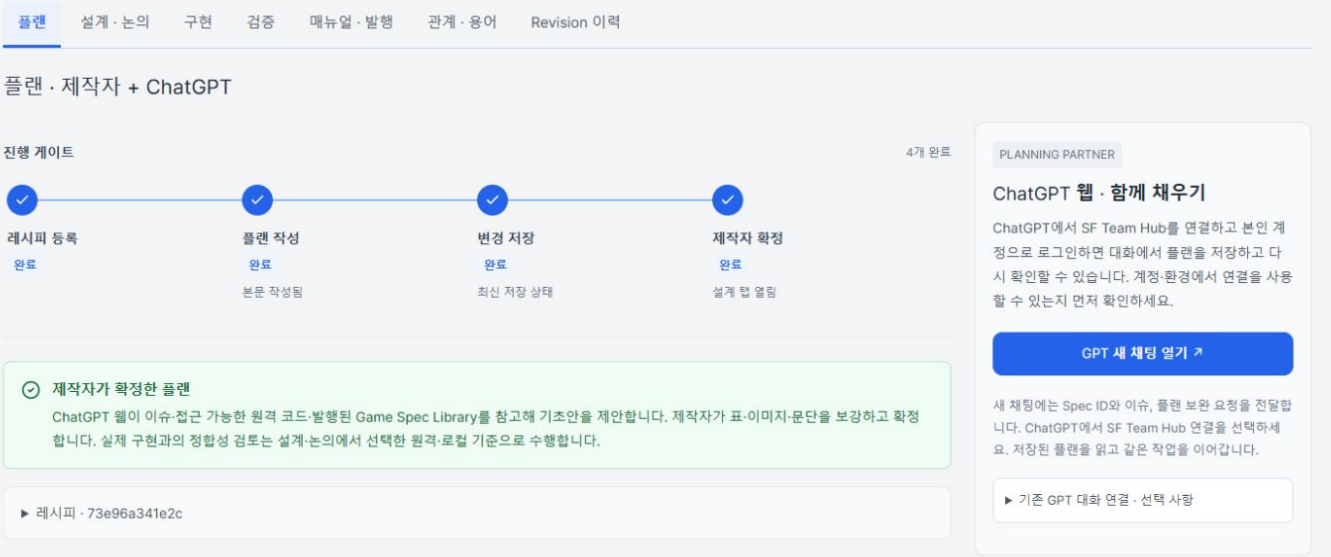

실제 SF Team Hub / Spec94 플랜 탭 / 2026-10-26. 선택한 공정 영역을 원본 화면에서 발췌했다.


구분	설계 및 확인한 결과
제작자 + GPT	목표·범위·보존 대상·완료 조건을 대화로 구체화한다. 표·이미지·문단을 보완하고 같은 Spec에 저장한다.
저장 후 확인	저장 receipt와 최신 문서 readback을 대조한다. 화면의 변경 저장 완료는 문서가 저장됐다는 상태다.
제작자 확정	실제 사용자 결정으로 플랜을 확정한다. 화면의 4개 완료는 이 Spec이 설계 기준 문서를 갖췄음을 뜻한다.

확정한 플랜의 변경은 새 Revision에서 이어간다. 상단의 현재 단계·게이트·다음 액션은 Spec 전체 상태이므로, 플랜 탭이 완료돼도 최종 발행 완료와 같지 않다.

SITE WALKTHROUGH 02 / DESIGN

설계 검토와 사람의 선택을 연결한다

확정 플랜의 요구사항·책임·기술적 타당성을 검토하고, 논점을 수렴해 UML로 연결한다.

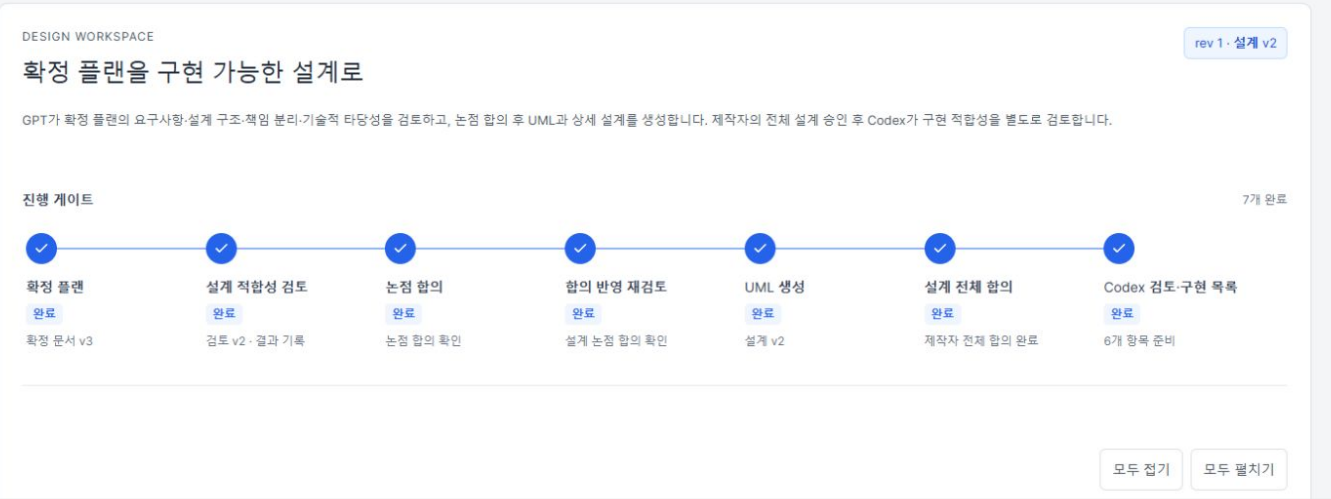

실제 설계 작업 공간. 확정 문서v3와 설계v2에 연결된 7단계 진행 게이트다.

구분	설계 및 확인한 결과
01 확정 플랜	설계의 입력 문서·Revision·Recipe를 고정한다.
02 검토 → 03 논점	GPT가 설계 적합성의 근거와 미확인을 기록한다. 사람이 방안을 선택하거나 직접 결론을 정한다.
04 재검토 → 05 UML	합의가 반영됐는지 재검토하고 도식과 상세 설계를 생성한다.
06 전체 합의	제작자가 전체 설계를 별도로 승인한다. 논점 하나의 합의로 전체 승인을 대신하지 않는다.
07 Codex 인계	Codex가 실제 구현 적합성을 확인하고 승인된 UML에 연결된 구현 목록으로 구체화한다.

설계 가능성과 제품 검증의 구분

현재 화면은 설계 공정 7단계 완료다. 코드·에셋·Unreal 실환경의 미검증은 해당 근거로 보존하고 구현·검증 단계에서 다룬다.

근거 [S14] / 사이트의 실제 표시 문구와 단계 순서를 반영.

SITE WALKTHROUGH 03 / UML

도식과 버전을 구현 근거로 남긴다

설계 요약·UML·요소·관계를 저장하고, 어떤 설계를 승인했는지 이력으로 추적한다.



Spec94 설계v2의 실제 시퀀스 도식 일부. 화면에 맞추기 56% 보기이며 전체 관계의 상단·중간을 발췌했다.

구분	설계 및 확인한 결과
상호작용 정의	제작자·GPT·공통 서버 MCP·Issue·Spec Store·기술 검토·Codex·새 기기 간 요청과 응답을 연결한다. 계정별 플러그인 배포를 요구하는 구조로 설명하지 않는다.
구현과 연결	구현 항목은 설계 버전과 실제 도식 요소·관계를 참조한다. 설계가 바뀌면 영향 항목을 재검토한다.
재개 조건 명시	새 대화는 Spec ID로 현재 버전·상태·결정을 복원한다. 복원 자체를 새 승인·자동 구현 실행으로 처리하지 않는다.


이 도식은 공정의 책임과 저장 계약을 설명한다. 화살표가 존재한다는 사실만으로 모든 환경의 실제 실행 성공을 주장하지 않는다.

근거 [S14] / 실제 렌더링된 Mermaid를 캡처. 도식·데이터를 재생성하거나 바꾸지 않음.

SITE WALKTHROUGH 04 / IMPLEMENTATION

Codex가 항목별로 구현하고 근거를 남긴다

로컬·원격 Codex가 Spec ID로 승인된 범위를 읽고, 실제 결과와 완료 조건을 대조한다.

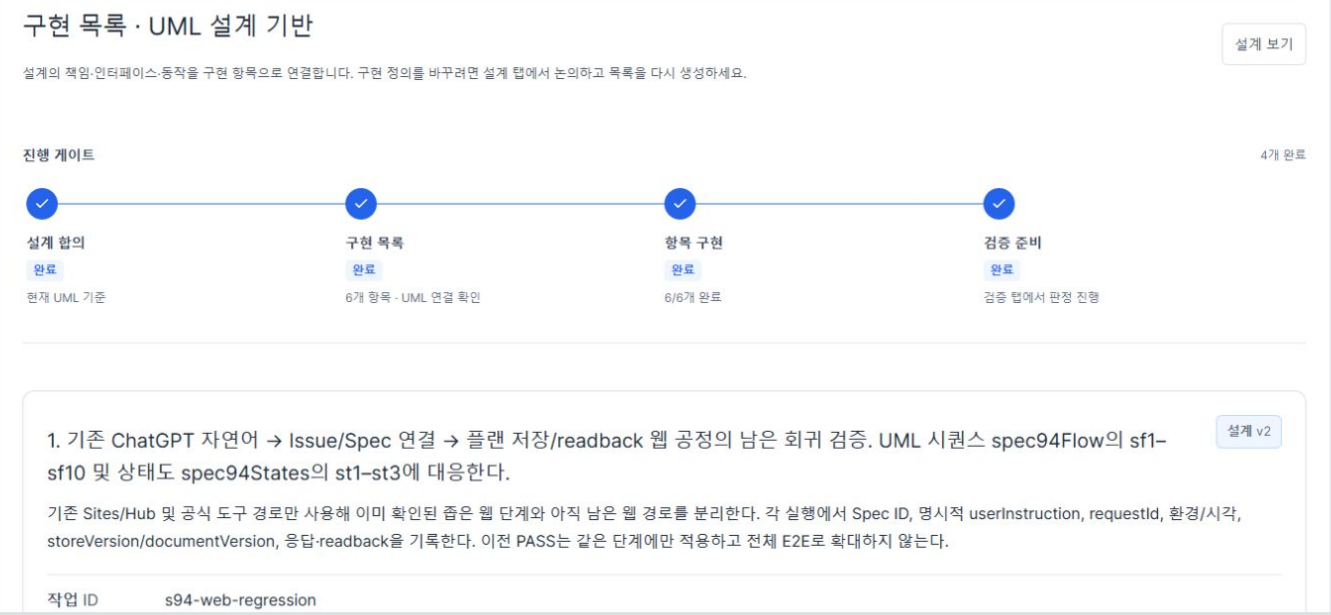

실제 구현 탭. UML 기반 구현 목록과 6/6개 완료, 실제 항목 정의가 표시된다.

구분	설계 및 확인한 결과
인계 입력	Spec ID·Revision, 확정 플랜·승인 UML·작업 저장소·권한을 확인한다. GPT의 설계 준비와 Codex의 구현 실행을 구분한다.
항목 계약	작업 ID, 선행 작업, 변경 내용, 완료 조건, 검증 방법, UML 근거와 실행 메모를 연결한다.
완료 동기화	실제 관찰 기록과 해당 조건을 대조해 항목 완료를 저장한다. 구현 완료 체크와 검증 페이지의 판정은 별도다.


Spec94는 승인된 6개 검증·검토 항목을 완료한 사례다. 이 화면의 6/6은 게임 기능 전체나 다른 Spec의 구현 완료를 뜻하지 않는다.

근거 [S14] / 현재 구현 상태를 조회·캡처했으며 체크 상태를 조작하지 않음.

SITE WALKTHROUGH 05 / VERIFICATION

AI 판정과 사람 수락을 따로 확인한다

구현 항목에 검증 정의와 증거를 연결하고, 필수 판정·근거를 갖춘 뒤 VERIFY를 확정한다.

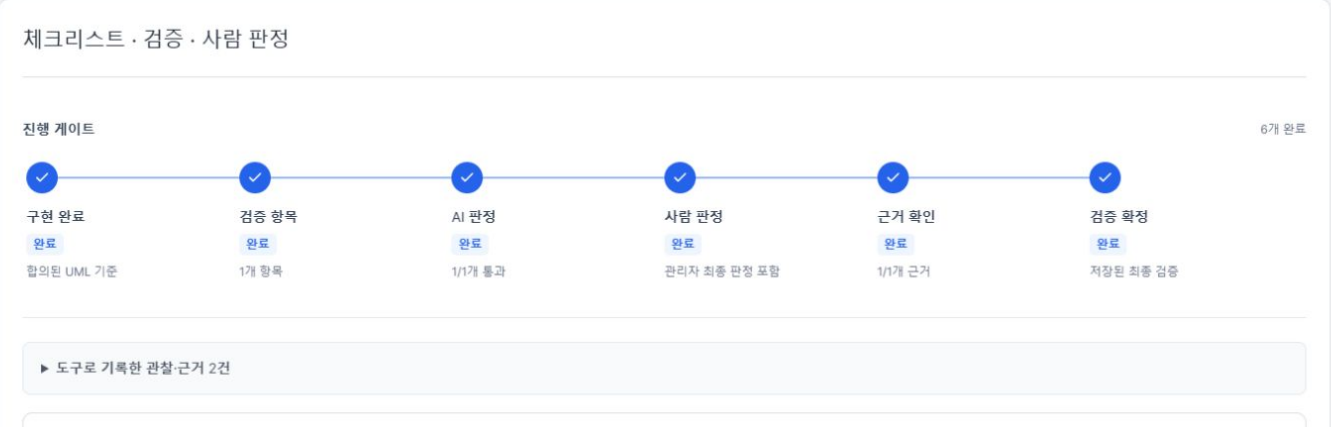

실제 검증 탭. 구현 완료 → 검증 항목 → AI 판정 → 사람 판정 → 근거 확인 → 검증 확정 순서다.

구분	설계 및 확인한 결과
검증 정의	무엇을 기대하고 어떤 증거가 필요한지 정한다. AI·Human·Both 중 판정 주체를 지정한다.
실행·근거 대조	관찰·URL·경로·결과와 미검증 범위를 저장한다. AI PASS는 실제 기대 조건을 충족한 범위에만 적용한다.
사람 판정	필요한 사용자 수락과 근거를 별도로 저장한다. 도구 실행 결과를 사람의 제품 수락으로 자동 치환하지 않는다.
정식 VERIFY	서버가 필수 조건을 검사하고 최종 검증 시각을 저장한다. Spec94는 2026-10-26 14:17 KST 확정을 확인했다.

화면의 현재 결과


Spec94의 승인 범위는 6개, 체크리스트는 1개 정합성 검증이다. iOS는 후속 보류/NOT_TESTED를 유지하며 전체 플랫폼 E2E 성공으로 확대하지 않는다.

근거 [S14] / 저장된 판정·검증 상태의 실제 화면.

SITE WALKTHROUGH 06 / PUBLICATION

매뉴얼·원격 main을 확인한 뒤 발행한다

검증된 결과를 사용·편집·운영 가이드로 정리하고, 원격 반영 근거를 확인한다.

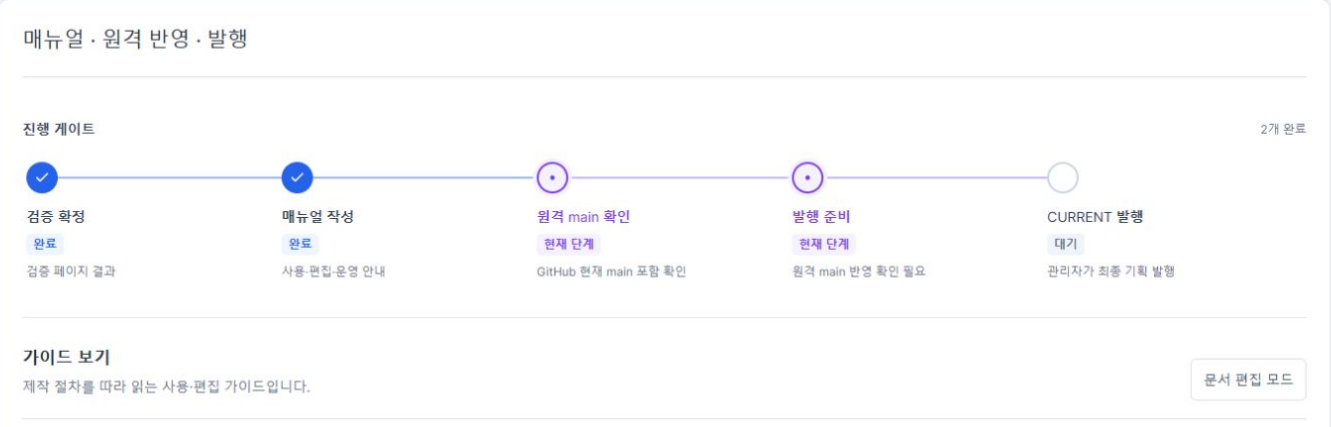

실제 매뉴얼·발행 탭. 검증·매뉴얼은 완료, 원격 main 확인과 CURRENT 발행은 대기 중이다.

구분	설계 및 확인한 결과
매뉴얼 작성	사용·편집·운영 절차와 실제 완료 범위, 한계, 재개 조건을 남긴다.
원격 main 확인	Agent가 변경 목록·커밋·원격 포함 여부를 확인하고 전용 근거를 저장한다. 로컬 저장이나 빌드 성공으로 대체하지 않는다.
CURRENT 발행	필수 검증·매뉴얼·원격 반영 조건을 갖춘 뒤 관리자가 발행한다. 이전 발행본과 Revision 이력은 유지한다.


현재 Spec94의 경계

VERIFY 완료와 발행 완료는 서로 다르다. 이 화면은 원격 main 반영 확인이 남아 있음을 그대로 보여준다. 포트폴리오 캡처를 위해 발행 조건을 바꾸지 않았다.

SITE WALKTHROUGH 07 / LIBRARY

발행본을 다음 제작의 기준으로 찾는다

Game Spec Library에는 구현·검증 후 발행된 CURRENT가 표시된다.

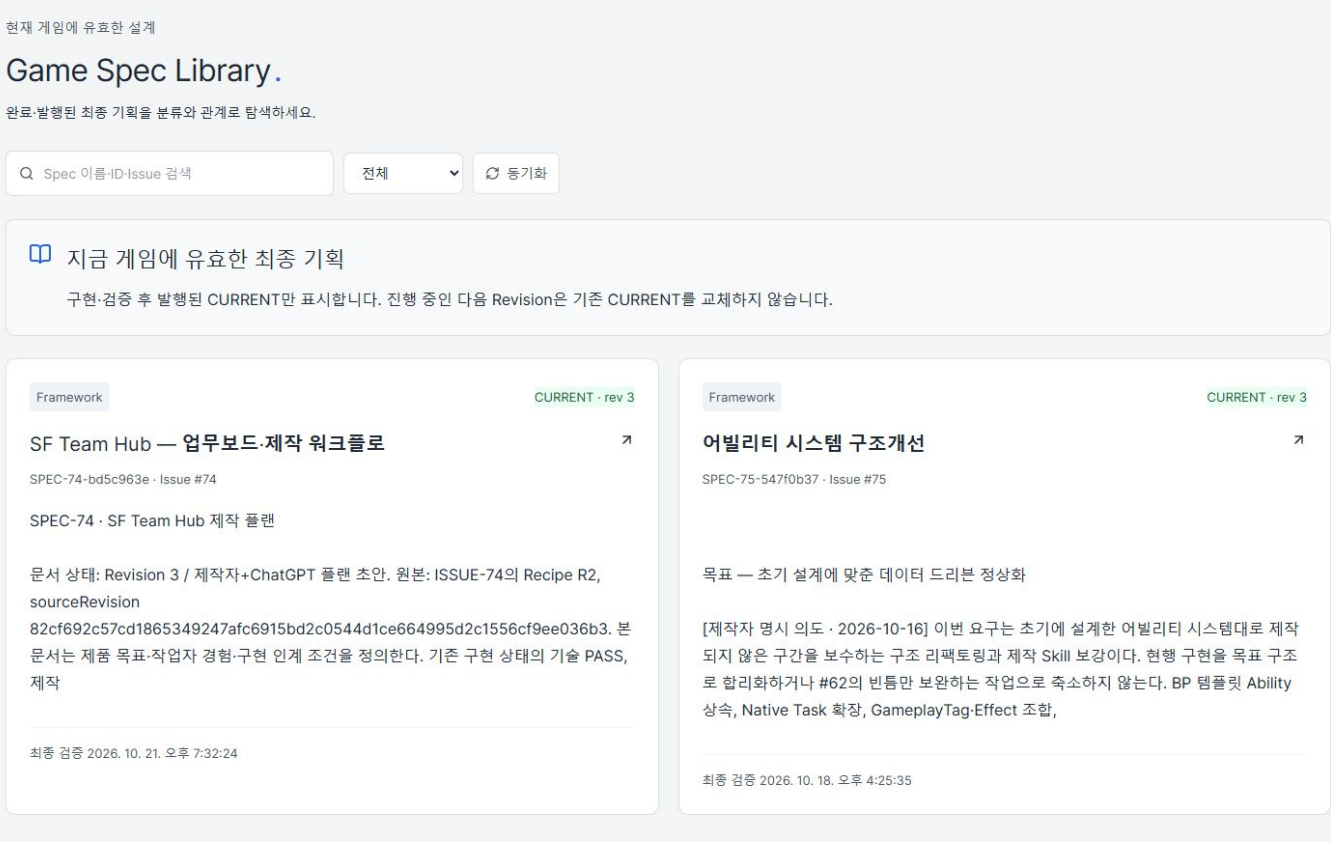

실제 Game Spec Library. SF Team Hub SPEC-74 R3와 어빌리티 구조개선 SPEC-75 R3의 CURRENT 카드다.

구분	설계 및 확인한 결과
진행본과 발행본	업무보드는 현재 작업을, Library는 게임에 유효한 발행본을 보여준다. 다음 Revision의 작업 중에도 기존 CURRENT를 유지한다.
근거 있는 재사용	새 작업에서 발행 기획·관계·용어를 읽고 기존 시스템과 연결한다. 초안을 발행 정본으로 오인하지 않는다.
끝에서 다시 시작	Creator가 다음 목표를 정하면 Issue·Spec·직접 요청 중 적합한 경로로 이어간다. Programmer는 완료 작업을 종합 검토해 공정을 개선한다.

사이트의 실제 동작을 보여주는 예시이며, 포트폴리오 갱신 과정에서 저장·승인·구현·발행을 재실행하지 않았다.

04 / LATEST VALIDATION

공통 서버 MCP로 같은 Spec을 이어간다

팀원별 플러그인 배포 대신, SF Team Hub 서버 MCP의 공통 연결을 사용해 검증했다.

개인 GPT
자연어 기획·조회

→

서버 MCP / Hub
공통 연결 / Spec 상태

→

로컬·원격 Codex
구현·검증·보고

구분	설계 및 확인한 결과
공통 서버 MCP	팀원 계정별 플러그인을 배포하지 않는 방향으로 정리했다. 기존 SF Team Hub 서버 MCP에 연결해 실제 조회·저장·readback을 테스트했다. 계정은 허용 범위와 작성자 귀속을 확인하는 기준이다.
Android / 두 계정	섬남자·김준호 두 승인 계정에서 같은 서버 MCP 공정의 Android 확인을 완료했다. Spec91의 본문 저장·수정·웹 동일성과 Spec94의 제한 저장·재조회 근거를 연결했다.
새 채팅 복원	Spec ID로 현재 단계·문서·UML·승인 이력을 조회했다. 첫 요약이 최신 결정을 놓쳐 기록 페이지를 끝까지 읽은 뒤 정정했다.
승인된 6개 범위	6개 구현 완료, AI 정합성 PASS, 사용자 수락, 완료 보고서 저장 후 정식 VERIFY 확정. iOS는 사용자 승인으로 후속 보류했다.

현재 상태를 정확히 보고

Spec94는 VERIFY 완료, Store72 / Revision1 / 플랜v3 / UMLv2. 현재 Hub는 원격 main 확인 대기로 MANUAL에 있으며 CURRENT 발행은 남아 있다. Android의 사용자 확인과 Codex의 직접 관찰 범위를 구분한다.


운영 기준: 공통 서버 MCP를 사용하며 팀원별 플러그인 제작·배포는 후속 과제로 두지 않는다. 최신 결정과 이력을 함께 읽어 재개하고, iOS는 NOT_TESTED로 보존한다.

근거 [S4][S5] / 서버 회귀·실계정·기기 검증을 구분. 전체 플랫폼 E2E PASS 주장 없음.

05 / OFFICIAL MCP

도구 이름보다 실제 효과를 검증한다

공식 Unreal MCP를 우선 사용하고, 반복되는 제작 요구에만 최소 확장을 더한다.

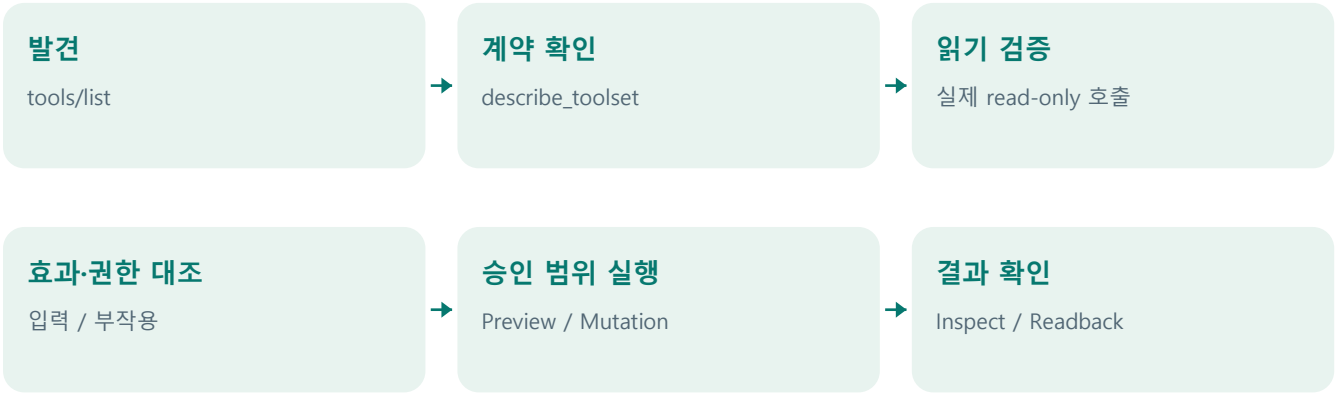

실행 준비 상태를 분명히 나누기

구분	설계 및 확인한 결과
BLOCKED	Editor·listener·인증 등 연결이 없어 실제 탐색을 못한 상태. 기능 부재로 판정하지 않는다.
CAPABILITY_GAP	정상적인 탐색과 계약 대조 후 필요한 효과가 없음을 확인한 상태.
기술 PASS	호출·빌드·자동 검사에서 실제 확인한 범위. PIE·패키징·Creator 체감 수용과 별도다.

프로젝트 확장의 범위

World·Character·Combat·Camera·UI 등 도메인 Toolset이 반복 제작을 지원한다. Skill은 판단·입출력·품질 기준을, Toolset은 Unreal의 실제 조작과 조회를 소유한다. 데이터 처리 알고리즘과 transport를 중복 구현하지 않는다.

예: Motion Matching 네이티브 준비

엔진 PoseSearch trajectory API를 재사용하는 opt-in 기반을 준비했다. 당시 소스 컴파일과 projectfiles 생성은 확인했지만, 전체 링크·live MCP는 차단됐고 자동화 실행·ABP 소비·실제 전환은 미검증으로 남겼다.

근거 [S6] / 준비 시점의 차단은 현재 세션 상태로 자동 승계하지 않음.

06 / WORLD PRODUCTION

GIS 입력을 편집 가능한 월드로

이전 NeoSeoul 프로토타입의 제작 공정과 증거를 재사용 가능한 사례로 정리했다.

GIS / Canonical
좌표·단위·원본

→


Unreal 제작
지형·도로·수계

→


검증·보존
저장·재로드·접지



2026-10-07 저장 상태. 지형·수계 기반을 보여주는 과거 캡처이며 새 선형 월드의 완료 화면이 아니다.

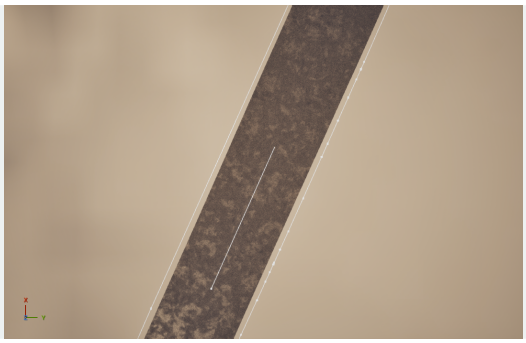

대표 S001 / 2026-10-08 / 제작 전

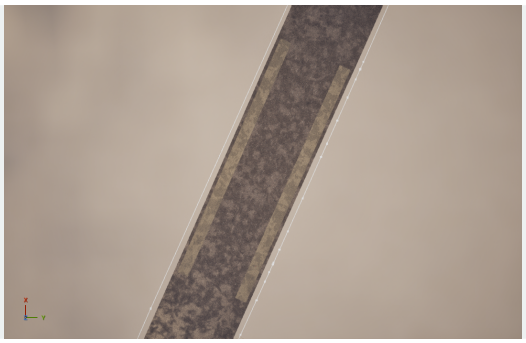

대표 S001 / 2026-10-08 / 차선·보도 제작 후

#54 기록: 표시·보도 247구간과 신규 기반 도로면 32개를 제작하고 기존 14개 기반 도로면을 보존했다. 대표 보행·충돌과 저장·재조회 근거를 남겼으며 Owner는 한계를 포함한 playable rough를 수용했다.

원거리 Landscape 가림, 수계 최종 표현, 전체 구간 실보행·패키징·목표 하드웨어 성능은 별도 범위다. 전후 이미지 한 쌍을 247구간 전체의 품질 증명으로 사용하지 않는다.

07 / SPATIAL OWNERSHIP

부분 수정이 가능한 공간·소유권 구조

Streaming 단위와 제작 범위, 도메인 책임을 분리해 기존 수작업을 보호한다.

구분	설계 및 확인한 결과
World Partition Cell	Unreal 로드·저장·runtime streaming 단위.
Gameplay Area	행정구역 등 인게임 의미와 규칙의 범위. Streaming cell과 일대일로 고정하지 않는다.
Production Partition	독립 생성·수정·보존·검증 범위. 반복 실행의 실제 의존성과 feature identity를 유지한다.
도메인 레이어	지형 원본과 Edit Layers, 수계 형상·Zone, 기반 도로면·차선·보도를 구분한다.



롯데 지구 WholeSiteComposition7 / 기존 rough 구성. 타워·몰·섬의 공간 관계를 연결한 단계.

생성 결과를 수정할 때 입력 identity·hash와 변경 대상을 확인하고, scoped save·reload/readback 및 비대상·보호 파일 보존을 증명한다. 설명상의 제작 레이어를 모두 Unreal Data Layer 구현으로 해석하지 않는다.

다음 품질 단계

시각 Pilot과 물가 진단에서 수면 패치 밝기·거친 접촉 경계를 확인했다. 물이 보이고 binding이 맞는 기술 상태와 최종 미적 품질 수용을 구분한다. 전체 World mutation gate의 runner 연동은 문서상 미완료다.

근거 [S7][S8] / 영역별 과거 Evidence와 현재 아키텍처 경계.

08 / COMBAT PRODUCTION

편집 지점과 실행 책임을 연결한다

Creator의 타이밍·입력 요구를 GAS, Montage, 프로필 데이터와 실제 PIE로 검증했다.


캐릭터 정의
이동·액션·AI 참조

→

Ability / Montage
입력·상태·Notify

→

BP / Runtime
본·소켓·실제 접촉

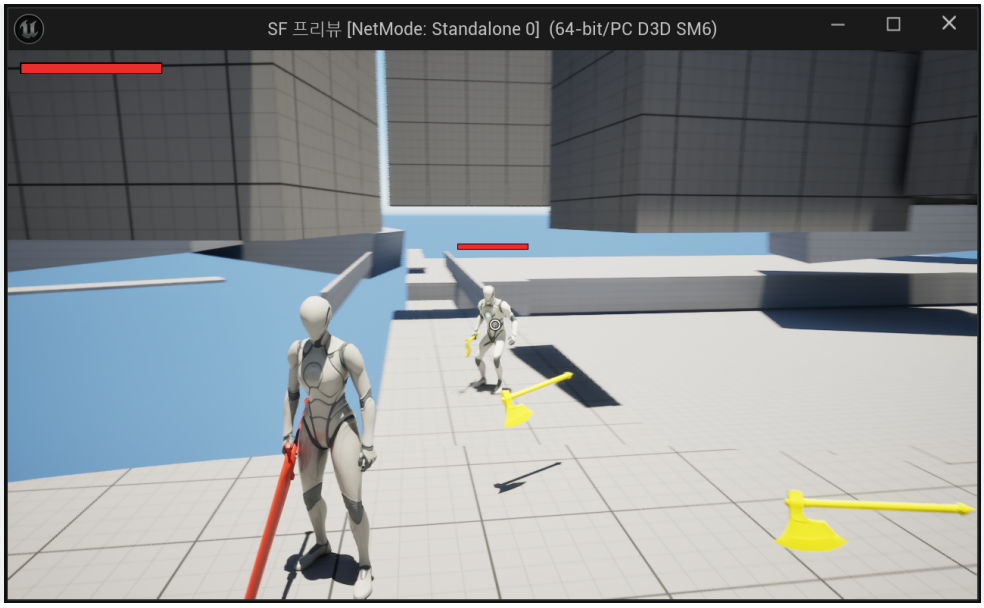

Teyvat Standalone PIE / 2026-10-10. 락온·체력 표시. 당시 분리된 무기 외형을 포함한 테스트 화면.

구분	설계 및 확인한 결과
Creator 편집	몽타주에서 공격·보호 구간을, BP에서 공격·피격 shape를, 데이터에서 거리·쿨타임·프로필을 편집한다.
Agent 구현·검증	3타·가드·취소·잠금 정리·적당 공격 1회 접촉, 피해·행동 복귀, 저장·재시작의 결과를 대조했다.
기록된 결과	2026-10-09 #62: Editor/Game 빌드, 자동 검사25/25, 프로필 parity. 9개체 PIE에서 동시 공격 최대1과 배회·접지를 관측했다.

해당 시점의 기술 검증이다. 전투 시스템 전체 완료, 네트워크 예측, 대규모 군집·패키징과 Creator의 최종 체감 수용은 별도로 확인한다.

근거 [S7][S9] / 테스트 수는 서로 다른 checkpoint와 합산하지 않음.

09 / CHARACTER PRODUCTION

MetaHuman 제작 원본을 유지한 통합

기본 몬스터의 외형·애니메이션·행동을 같은 편집 가능한 결과물로 연결했다.


MHC / 조립 BP
외형·참조 보존

→


Body / Face / 의상
Anim / Leader Pose

→


몬스터 행동
공격 / 완료 / 복귀

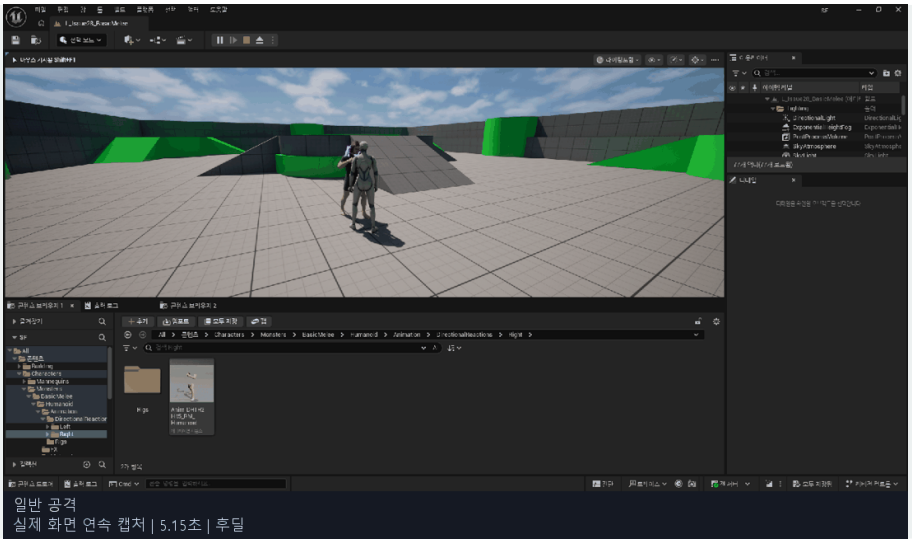

2026-10-06 normal.gif의 실제 4번째 프레임. 기본 몬스터 일반 공격 검증 장면.

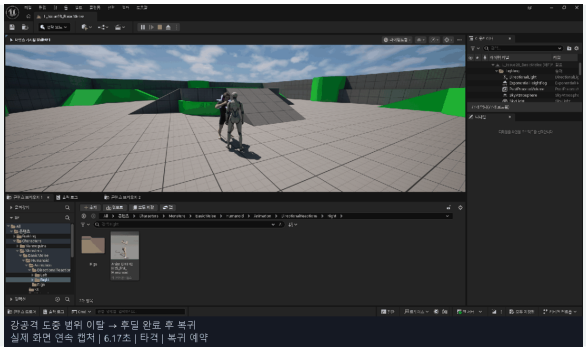

실제 heavy-return.gif / 강공격 완료 경로

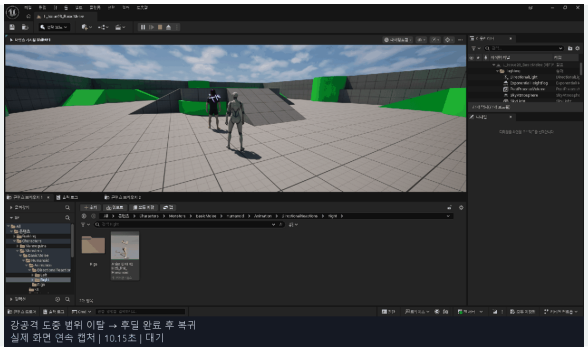

같은 GIF / 대기 상태 복귀

Body·Face·Clothing 참조와 실제 PIE AnimInstance를 조회하고 일반·강공격·복귀를 관측했다. main 통합 후 자동검사 9건(성공8·경고 포함 성공1), 실패0 및 MapCheck 오류·경고0이 기록됐다.


약 1초 간격 원본 캡처에서 추출한 프레임이다. 미세한 발 미끄러짐·의상 품질·고프레임 동작 수용, cook·멀티플레이·최종 외형 승인은 이 자료로 대체하지 않는다.

근거 [S7][S10] / #28 기본 몬스터 사례. 다른 캐릭터 제작 완료로 확대하지 않음.

10 / DATAFORGE

하나의 데이터 의미를 Client·Server로

Authoring 원본과 생성물을 분리하고 실제 Unreal Bake·Readback까지 연결했다.

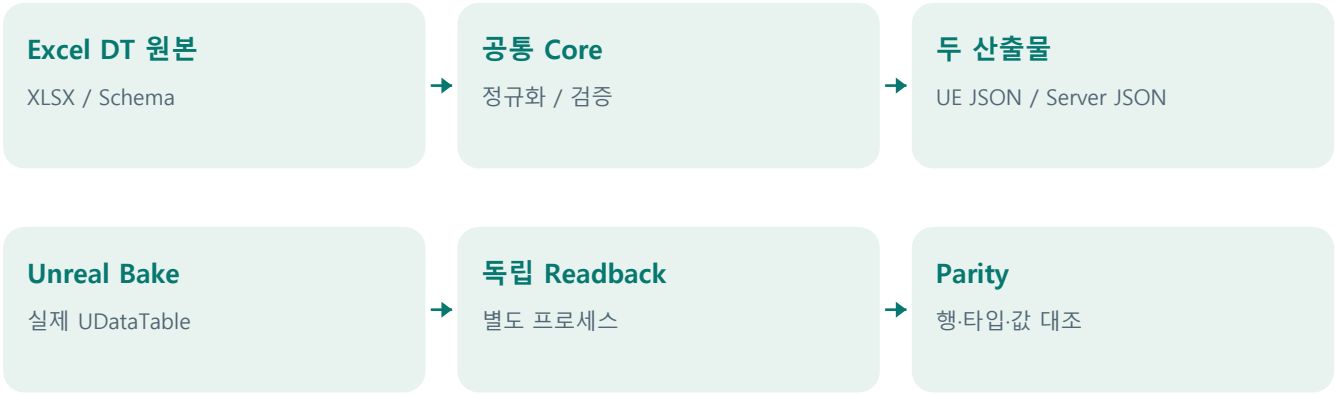

구분	설계 및 확인한 결과
GUI / CLI	같은 Core를 사용해 dataset을 선택·변경 빌드하고 결과·오류·마지막 정상 상태를 확인한다.
증분 처리	Git 변경 후보와 데이터 의미 fingerprint를 대조해 불필요한 재생성을 피한다. 잘못된 입력은 기존 정상 산출물을 보존한다.
SoT 구분	DataTable은 Excel authoring. DataAsset·Config는 Unreal 원본을 유지하고 native read-only 조회·추출한다.
검증 기록	당시 Core25건, 후속 Git 필터29건의 회귀 PASS가 각각 기록됐다. 서로 다른 시점의 검사이며 합산하지 않는다.

설계 가치

실제 엔진이 해석한 결과와 원본의 의미를 비교한다. 파일 생성 성공을 데이터 정확성으로 대체하지 않으며, Unreal의 UAsset·Config 해석을 외부 도구에서 다시 구현하지 않는다.


고급 타입 전체, 모든 runtime 소비자 전환, DA·Config write-back과 서버 패키지 전체 검증은 별도 범위다.

근거 [S11] / DataForge 공개 사례, 현재 아키텍처와 당시 검증 기록.

11 / RPCNET

재사용할 통신 기반과 게임 의미의 분리

실무의 클라이언트 네트워크 설계 경험을 개인 R&D;로 확장하고 실제 서버와 상호운용했다.



RPCNet은 상용 Unreal 프로젝트의 네트워크 전환·프레임워크 설계 경험을 바탕으로 ProjectSF에서 별도로 개발했다. 원본 상용 코드·자료와 개인 구현의 경계를 유지한다.



구분	설계 및 확인한 결과
Framework 책임	연결·세션·Transport·Codec·Envelope와 프로토콜 생성 기반. Login·Inventory 같은 게임별 의미는 Consumer가 소유한다.
코드 생성 경계	Schema → DTO/Proxy/Stub → 직접 작성 Endpoint → Domain Service. 재생성으로 사람이 작성한 로직을 덮어쓰지 않는다.
실제 검증 환경	RPCNet 통신을 검증하려고 Gateway·AS·GS를 구축했다. Mock/Memory 검사와 실제 TCP·Unreal 로그인·PlayerScope 적용을 구분했다.
당시 검사 결과	RPCNet checkpoint37건 PASS 및 Unreal 상호운용성 PASS. 서버 Foundation52건과 Gateway 배포58건은 각각 다른 시점의 검증이다.

독립 출시한 상용 서버 성과로 소개하지 않는다. Unreal Dedicated Server 실시간 gameplay 복제, Public TLS/WAN Unreal Client, 운영 HA·공유 RDB·대규모 부하는 미완료 또는 미검증이다.

근거 [S12][S13] / 2026-10-26 공개 포트폴리오의 출처·검증 목적 설명을 반영.

12 / EVIDENCE & NEXT STEPS

무엇을 확인했고, 무엇이 남았는가

구현·실행·제품 수용·발행을 분리한 상태 보고가 공정의 신뢰성을 만든다.

구분	설계 및 확인한 결과
공정 운영	Issue·Spec·직접 요청을 병행. SPEC-74의 발행 이력과 SPEC-94의 승인 범위 VERIFY를 별도 근거로 제시한다.
서버 MCP·모바일	팀원별 플러그인 배포는 채택하지 않았다. 공통 서버 MCP에서 조회·저장·readback과 Android2계정을 검증했다. iOS는 후속 보류다.
Unreal 콘텐츠	월드·전투·기본 몬스터의 당시 제작·PIE·저장 근거. 새 선형 월드의 제작 완료·최종 시각 수용과 구분한다.
도구·네트워크	DataForge 실제 bake/parity와 RPCNet 상호운용성. 전 소비자 전환·WAN·운영 부하까지 확대하지 않는다.

다음 개선의 우선순위

1 같은 지역에서 게임 루프 연결

탐험·사건·전투·보상·성장·저장·재진입을 한 지역에서 연결하고 Creator가 실제 경험으로 검수한다.

2 재개·보존·검증의 빈틈 축소

최신 결정 누락을 막는 상태 조회, World mutation gate 연동, 미검증 플랫폼·패키징·성능 경계를 실제 실행으로 줄인다.

3 공정 효과의 정량 측정

같은 조건의 작업을 대상으로 시간·수정 횟수·실패율·토큰 사용을 측정한다. 현재 PARTIAL 사용량을 총비용이나 생산성 향상률로 해석하지 않는다.

13 / SOURCES & BASELINE

자료 기준과 검증 범위

작성 기준일 2026-10-26 / 프로젝트 원본·공개 Snapshot·현재 Hub 상태를 대조했다.

원격 main 확인: ProjectSF a886641a78db (2026-10-25), UnrealAgentWorkflow b722bcde57d0 (2026-10-26). 로컬 ProjectSF HEAD fbddcd6a77bc와 Site c34c2a7도 별도로 확인했다. 원격과 로컬 상태를 같은 최신 구현으로 합치지 않았다.

S1 **ProjectSF AGENTS / Architecture / ProjectOverview**
ProjectSF 원격 main + 로컬 문서 대조

S2 **Creator-Centric Production / Architecture**
공개 실행·역할·상태 소유권

S3 **TeamHubProduction**
SPEC-74 R3 / v133 / 당시 수용·발행 기록

S4 **SF Team Hub 서버 MCP 연결**
공통 서버 MCP 검증 / 사용자 확인: 팀원별 플러그인 배포 미채택

S5 **Spec94 현재 상태 / 누적 검증 보고서**
Store72 / VERIFY 2026-10-26 05:17 UTC / private

S6 **Official MCP / MotionMatchingPreparation**
현재 코드·계약 및 당시 준비의 제한

S7 **AgentDrivenGameProduction**
공개된 2026-10-14 제작 Snapshot과 원본 이미지

S8 **GeoWorld Architecture / Issue-66 Evidence**
공간·소유권 계약 / 물가 read-only 진단

S9 **Issue-62 ValidationReport-20261009**
프로필·PIE·자동검사·보호 파일 대조

S10 **Issue-28 CommitValidation / 실행 캡처**
2026-10-06~07 / 원본 프레임·통합 검사

S11 **DataForge**
공개 사례 + ProjectSF 도구·검증 기록

S12 **RPCNet**
실무 경험의 출처와 개인 R&D 범위

S13 **ServerProduction**
RPCNet 통신 검증 목적의 서버 사례

S14 **SF Team Hub 실제 공정 화면**
2026-10-26 / 플랜·설계·UML·구현·검증·발행·Library

자료 이용 범위: 사용자 승인에 따라 SF Team Hub의 실제 공정 화면과 Spec 일부를 포함했다. 인증정보·권한 설정·비공개 코드 원문은 포함하지 않았다. 사이트 화면은 2026-10-26, 게임 화면은 각 캡션의 과거 시점이다.

이번 갱신에서는 SF Team Hub를 실제 읽기 전용 탐색·캡처했다. 저장·합의·발행을 재실행하지 않았다. 게임 빌드·서버·Editor 테스트는 과거 Evidence에 근거한다.
